

Zawada, 23.01.2023r.

Nr pisma: *WFB 23 E 000 127*

Dotyczy: **BADANIE RYNKU –  
zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: : „**Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO”** dla Enea Bioenergia sp. z o.o.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:  
[lukasz.piatek@enea.pl](mailto:lukasz.piatek@enea.pl), w terminie **do dnia 30.01.2023r. do godz. 10:00 (CET)**.

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Łukasz Piątek – Biuro Techniczne**  
tel. 506 219 092 , adres e-mail: [lukasz.piatek@enea.pl](mailto:lukasz.piatek@enea.pl)

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

**Z wyrazami szacunku:**

*JWA*  
Enea Bioenergia sp. z o.o.  
Dyrektor Departamentu Technicznego

Jarosław Krakówka

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

**Załącznik nr 1. Formularz informacji.**

(pieczęć wykonawcy)
---------------------

**Informacja** dotycząca badania rynku w zakresie usługi:

**„Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO”. dla Enea Bioenergia sp. z o.o..**

Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

--

działając w imieniu i na rzecz:

--

Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem są:

**„Dobudowa boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO””**

<p><b>Cena netto za:</b></p> <p>Cena netto za : Dobudowę boksu do istniejących boksów z bloczków betonowych w systemie „LEGO”</p> <p style="text-align: center;">..... PLN (słownie.....00/100)</p>
---

**1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .**

--

**2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.**

--

**3. ....**

--

--	--

**1. Przedmiot zamówienia dotyczy:**

- 1.1. Kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu dobudowy boksu ze ścian oporowych wykonanych z bloczków betonowych w systemie „Lego” do istniejących boksów wykonanych w systemie „Lego” zgodnie ze sztuką wykonania systemu.
- 1.2. Bloczki betonowe muszą być wykonane w takiej samej jakości oraz o takich samych wymiarach bloczków, zębów oraz otworów na zęby montażowe jak bloczki w istniejących boksach Zamawiającego.
- 1.3. Szczegółowy szkic docelowej konstrukcji boksów znajduje się na rysunku nr 2.

**2. Zamawiający szacuje, iż zamówienie obejmuje około (np. jd., szt., mtg, h, litr i inne jednostki rozliczeniowe):**

Cena obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania dobudowy boksu, a w tym dostawę dodatkowych nowych bloczków w wymaganej ilości, demontaż i montaż istniejącej części ściany bocznej i tylnej w celu wykonania łączenia dodatkowego boksu z istniejącą konstrukcją, zgodnie ze sztuką wykonania systemu „Lego”, a także wykonanie podsypki niwelacyjnej oraz bloczków uzupełniających ściany oporowe do lica pozwalających na dobudowę bosku wg. załączonego schematu nr 2 na placu Zamawiającego.

Wymiary zewnętrzne istniejących boksów: 7,2 m szerokość, 27,2 m długość, 2,4 m wysokość – rysunek nr 1

Wymiary zewnętrzne docelowych bosków: 7,2 m szerokości, 34,4 m długości, 2,4 m wysokości – rysunek nr 2

**3. Przedmiotem Zamówienia będzie wykonanie takich czynności/zakresu prac jak:**

- Dostawa i rozładunek na placu wskazanym przez Zamawiającego zlokalizowany na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A bloczków betonowych o szerokości 0,8m, wysokości 0,6m i długości 1,6m oraz bloczków uzupełniających ściany oporowe do lica o wymiarach 0,8m szerokości, 0,6m wysokości i 0,8m długości a także bloczków uzupełniających o wymiarach 0,8m szerokości, 0,6m wysokości i 1,2m długości wykonanych z betonu o klasie C25/30 w wymaganej ilości do zabudowy dodatkowego boksu w systemie „LEGO” zgodnie z przedstawionymi wymaganiami Zamawiającego.
- Demontaż wymaganych bloczków ze ściany bocznej i tylnej istniejącej konstrukcji bosku w celu wykonania łączenia między istniejącą konstrukcją i konstrukcją dobudowywaną zgodnie ze sztuką wykonania dla systemu „Lego”
- Dostawa i wykonanie podsypki niwelacyjnej pod ścianę boczną i tylną dobudowywanego boksu
- Ułożenie klocków zgodnie ze sztuką wykonania systemu „Lego” tak aby finalnie całość istniejących bosków i boksu dobudowanego miała wymiary przedstawione na rysunku nr 2.

**4. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zamówienia (wskazać):**

Wykonawca obowiązany jest posiadać możliwości techniczne, sprzętowe oraz odpowiednie zasoby kadrowe do wykonania w/w usługi w określonym w umowie terminie.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Instrukcje Wykonania Robót do realizowanej Usługi.

**5. Dokładne miejsce świadczenia zamówienia:**

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec na terenie Elektrowni Połaniec.

**6. Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:**

Do 15 dni roboczych liczony od dnia podpisania umowy.

**7. Termin płatności:**

30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac z wynikiem pozytywnym zatwierdzony przez strony.

**8. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:**

- 8.1. Doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w zakresie realizacji conajmniej 2 Usług wykonania boksów z prefabrykatów betonowych w systemie "Lego" na kwotę nie mniejszą niż 45 000,00 zł netto.
- 8.2. Odbycie szkolenia upoważniającego na wykonywanie prac na terenie Enea Elektrownia Połaniec realizowanego nieodpłatnie przez Służby BHP Enea Elektrownia Połaniec.
- 8.3. Wykonawca udostępni wymagane informacje w celu zgłoszenia osób na w/w szkolenie oraz wejście/wjazd na teren Elekwroni pracowników i sprzętu Wykonawcy.


**9. Okres obowiązkowego świadczenia gwarancji:**

- 9.1. Wymogi dotyczące gwarancji na przedmiot zamówienia: gwarancja minimum 24 miesiące na dostarczone bloczki betonowe oraz wykonane prace,
- 9.2. Wymagana Deklaracja zgodności dla bloczków w wykonanych z betonu wg PN-N 206:2013 - klasy C25/30.

**10. Część rysunkowa:**

**Rysunek nr 1: Wymiary istniejącego boksu**

**Wymiary zewnętrzne boksu: szerokość 7,20 m, długość 27,20 m, wysokość 2,40 m**

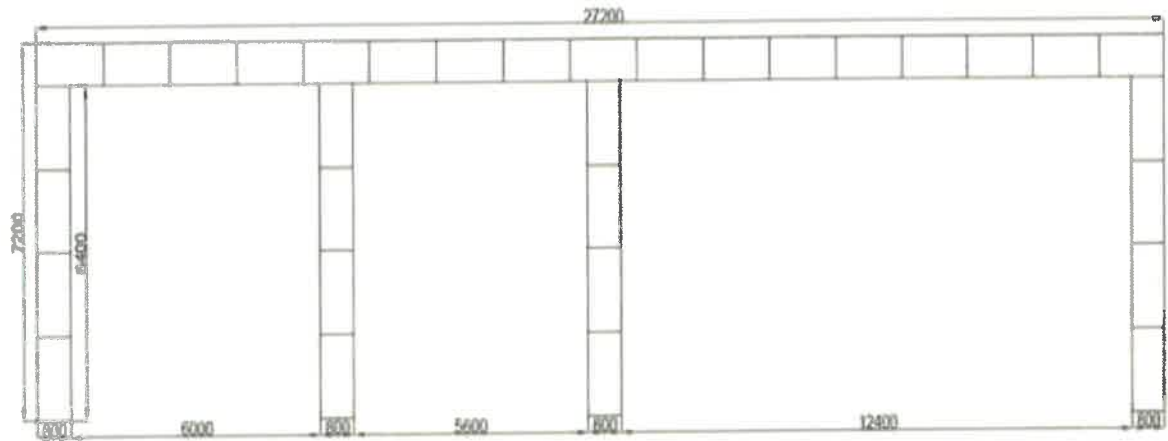

**Rysunek nr 2: Wymiary boksu docelowego.**

**Wymiary zewnętrzne boksu: szerokość 7,20 m, długość 34,40 m, wysokość 2,40 m**

